



現況検査により認められる状況の記録



| | |
|---|------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 61 |
| 場所 | AY 2 通り |
| 部位 | 2階床梁 (G 3) |
| 計画通りの配筋組であることを確認。 (上下主筋 : 3/2 - D19) | |

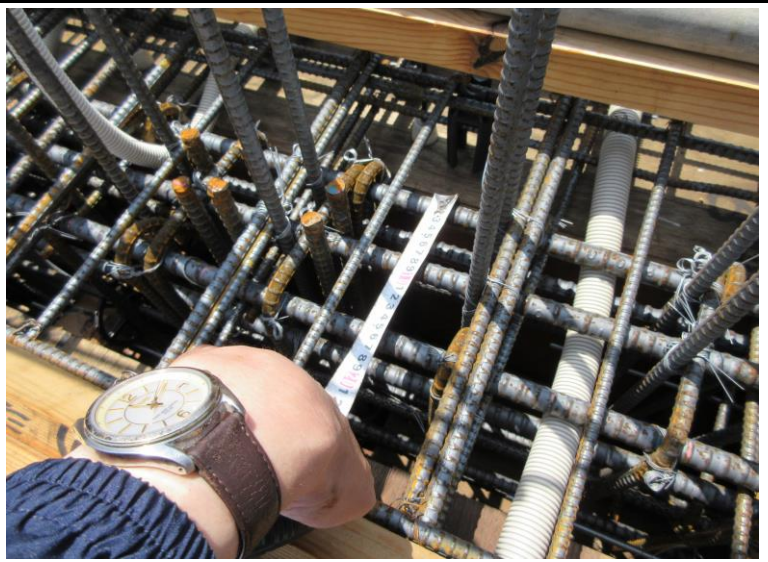

| | |
|-----------|------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 62 |
| 場所 | AY 2 通り |
| 部位 | 2階床梁 (G 3) |
| 同上。 | |

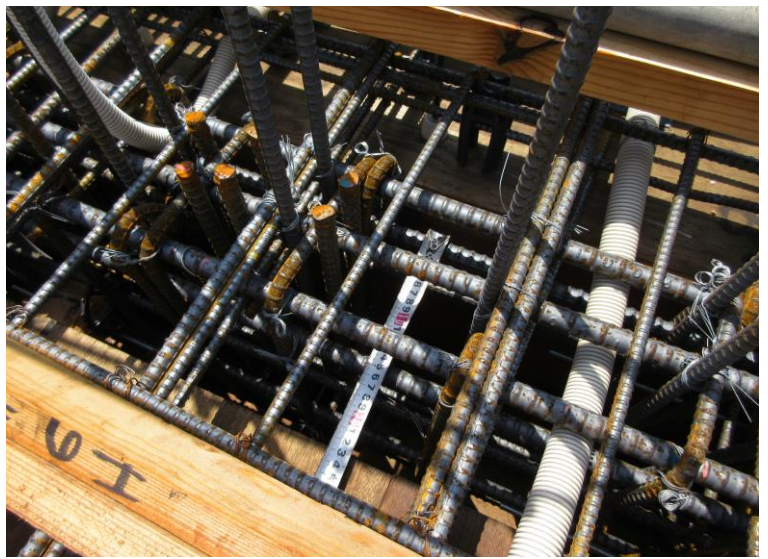

| | |
|-----------|------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 63 |
| 場所 | AY 2 通り |
| 部位 | 2階床梁 (G 3) |
| 同上。 | |

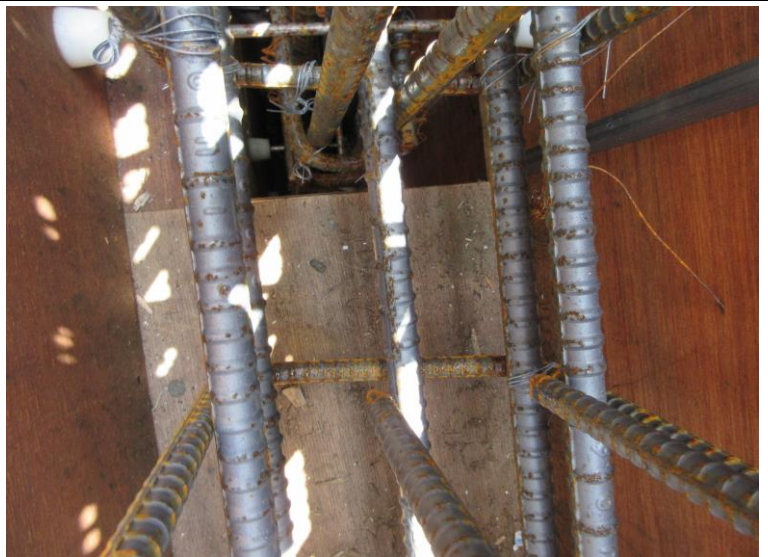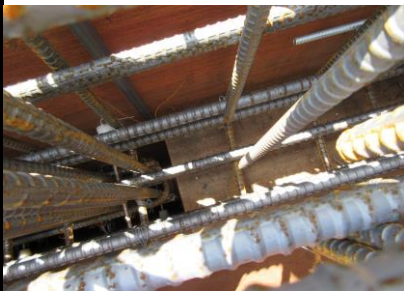

現況検査により認められる状況の記録

| | |
|---|------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 64 |
| 場所 | AY 2 通り |
| 部位 | 2階床梁 (G 3) |
| 計画通りの配筋組であることを確認。 (せん断補強筋：D13@150mm) | |



| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 65 |
| 場所 | AY 2 通り |
| 部位 | 2階床梁 (G 3 A) |
| 計画通りの配筋組であることを確認。 (上下主筋：3/2 - D19) | |



| | |
|---|--------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 66 |
| 場所 | AY 2 通り |
| 部位 | 2階床梁 (G 3 A) |
| 計画通りの配筋組であることを確認。 (せん断補強筋：D13@100mm) | |





現況検査により認められる状況の記録


| | |
|---|--------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 67 |
| 場所 | AY 2 通り |
| 部位 | 2階床梁 (G 3 A) |
| 隣り合う鉄筋の圧接 (継手) 部分の離隔距離 ($a \geq 400\text{mm}$ 以上) が確保されていることを確認。 | |



| | |
|-------------------------------|-------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 68 |
| 場所 | AY 1.5 通り |
| 部位 | 2階床小梁 (B 1) |
| AY 1.5 通りの2階床小梁 (B 1) の配筋組状況。 | |

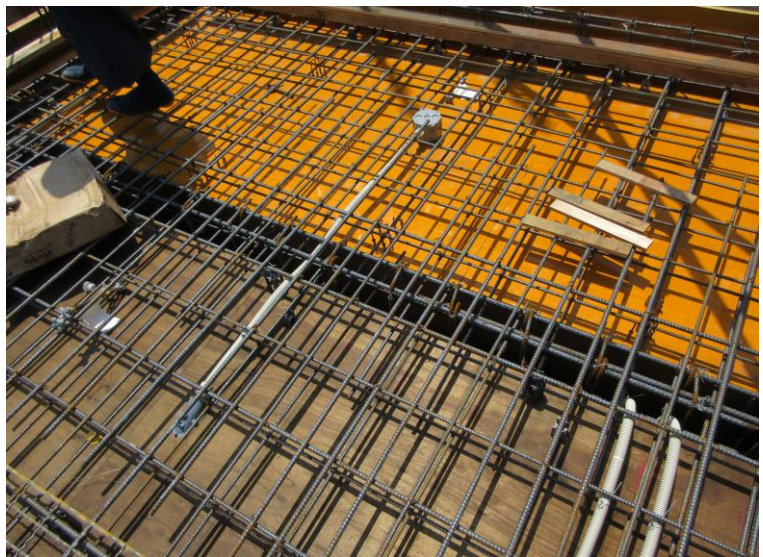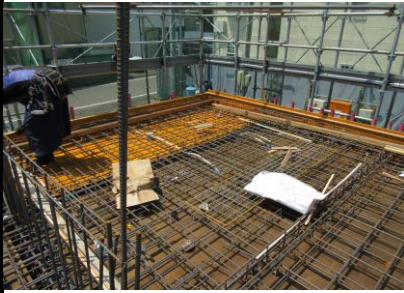


| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 69 |
| 場所 | AY 1.5 通り |
| 部位 | 2階床小梁 (B 1) |
| 計画通りの配筋組であることを確認。 (上下主筋 : 2 - D16) | |

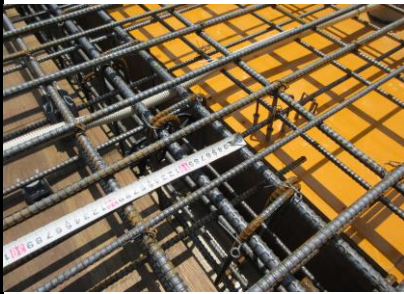


現況検査により認められる状況の記録

| | |
|-----------|------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 70 |
| 場所 | AY1.5通り |
| 部位 | 2階床小梁 (B1) |
| 同上。 | |

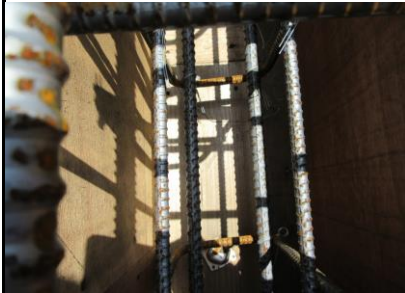


| | |
|---|------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 71 |
| 場所 | AY1.5通り |
| 部位 | 2階床小梁 (B1) |
| 計画通りの配筋組であることを確認。 (せん断補強筋：D10@200mm) | |

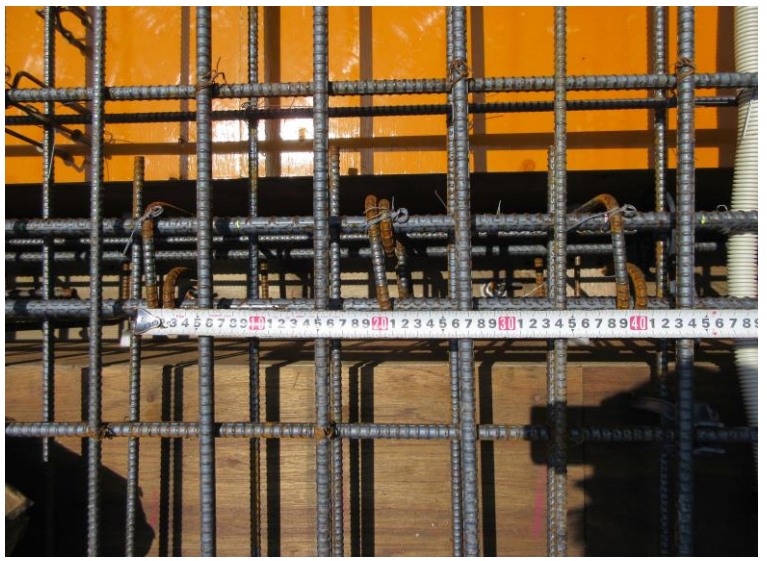



| | |
|--------------------------------|------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 72 |
| 場所 | AY1.5通り |
| 部位 | 2階床小梁 (B1) |
| 梁成が計画通り (450mm) に確保されていることを確認。 | |


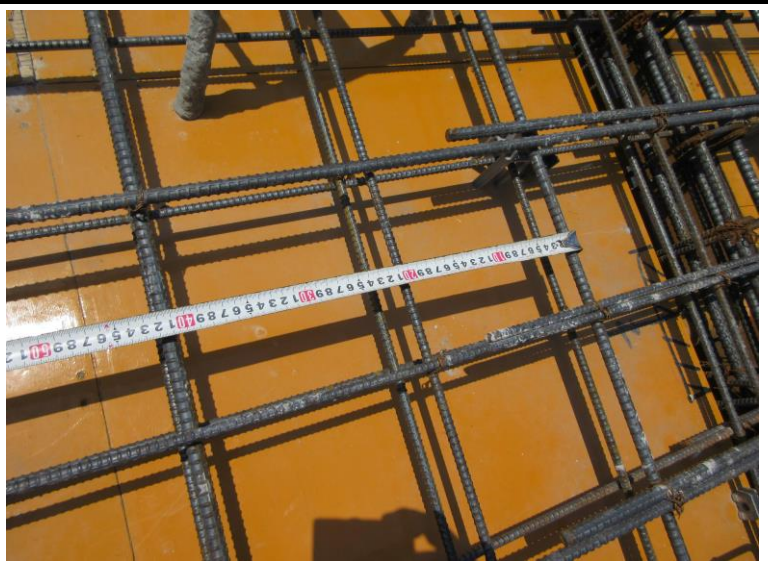



現況検査により認められる状況の記録

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 73 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S3) |
| AB棟 (A棟) の床スラブ (S3) の配筋組状況。 | |

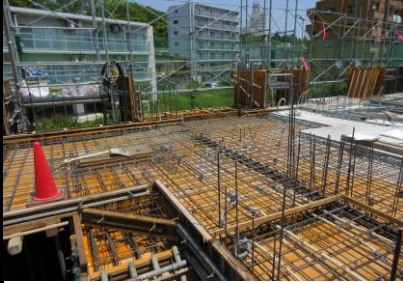


| | |
|--|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 74 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S3) |
| 計画通りの配筋組が行われていることを確認。上端筋D10・D13@200mmチドリ (縦横共) | |

| | |
|-----------|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 75 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S3) |
| 同上。 | |





現況検査により認められる状況の記録

| | |
|-----------|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 76 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S3) |
| 同上。 | |



| | |
|-----------|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 77 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S3) |
| 同上。 | |

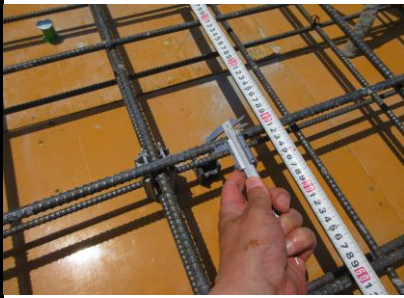


| | |
|--|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 78 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S3) |
| スラブ上下面の鉄筋かぶり厚さ (20mm以上)、及び、鉄筋間の空き (25mm以上) が確保されるようスペーサーが設置されていることを確認。 | |




現況検査により認められる状況の記録


| | |
|---|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 79 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S3) |
| スラブ上端筋の梁上部の直線定着長さ (L2: D13×35=455mm以上) が確保されていることを確認。 | |

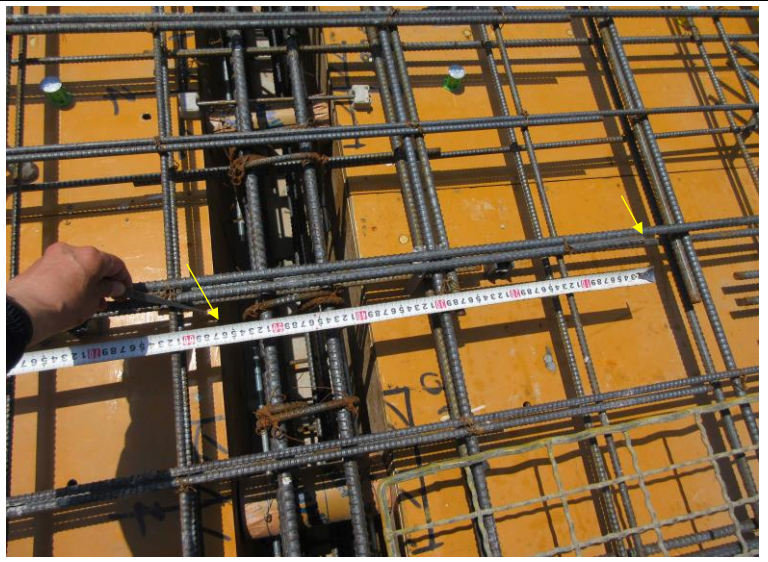

| | |
|--|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 80 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S4) |
| 計画通りの配筋組が行われていることを確認。D10・D13@200mmチドリ (縦横共: ダブル) | |

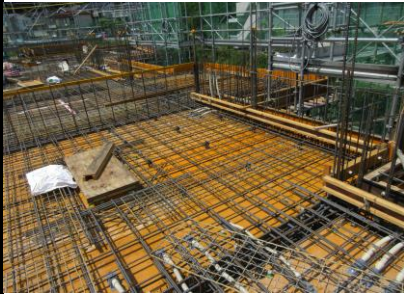

| | |
|-----------|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 81 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S4) |
| 同上。 | |

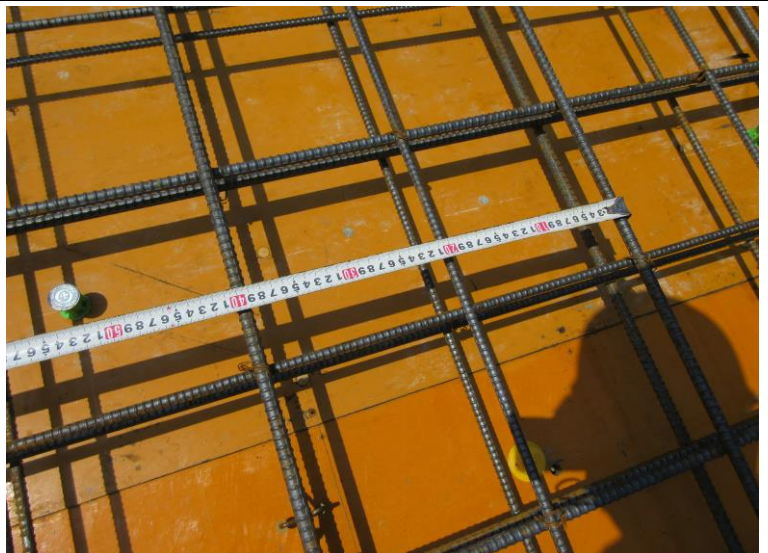


現況検査により認められる状況の記録


| | |
|-----------|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 82 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S4) |
| 同上。 | |




| | |
|-----------|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 83 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S4) |
| 同上。 | |

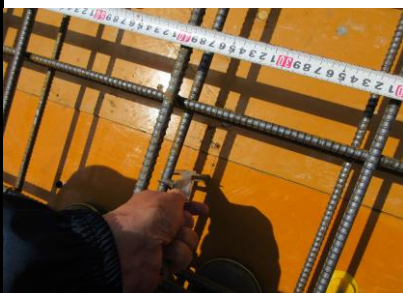




| | |
|--|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 84 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S4) |
| ダマ穴開口補強筋が計画 (施工図) 通りに設置されていることを確認。(開口廻りの縦横: 上筋2-D13、下筋2-D13) | |

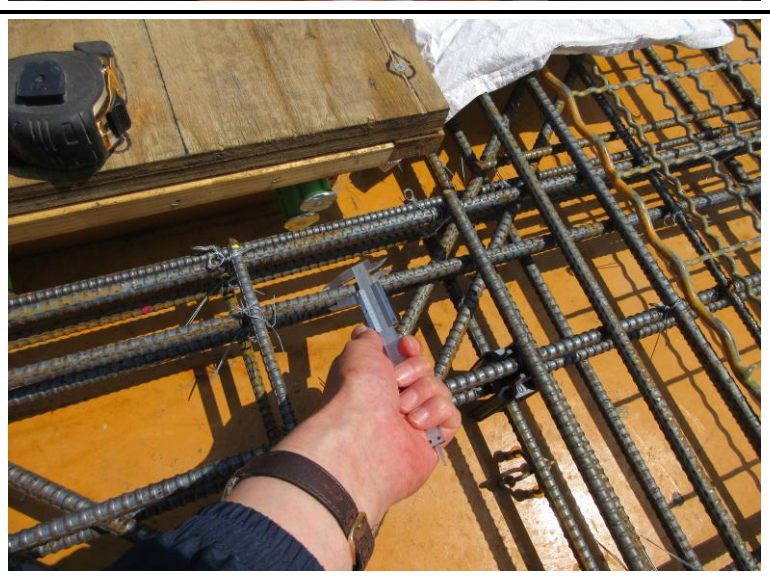現況検査により認められる状況の記録


| | |
|---|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 85 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S4) |
| 同上。(開口廻りの斜筋:上筋1-D13、下筋1-D13) また、余長部の定着長さ (L1: D13×40 d =520mm) が確保されていることを確認。 | |
|  | |

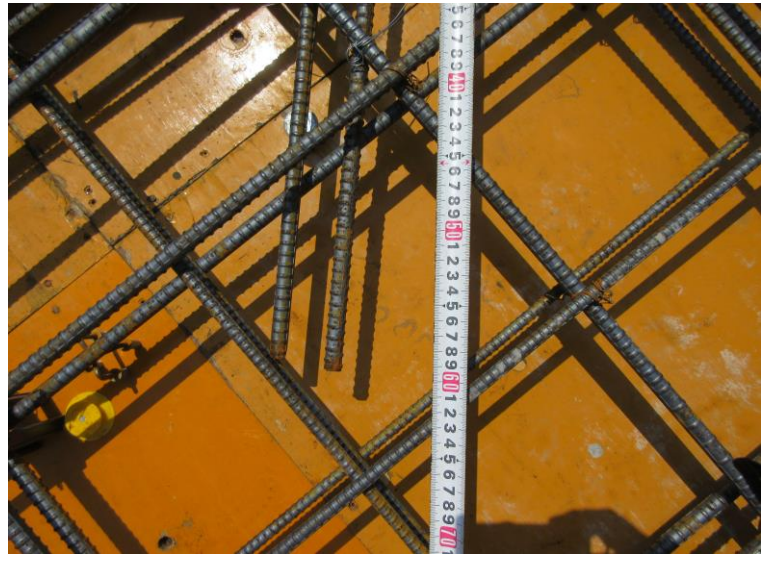

| | |
|---|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 86 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S4) |
| 床スラブ貫通部のスリーブ廻りには、鉄筋かぶり厚さ (20mm以上) が確保されていることを確認。 | |
|  | |


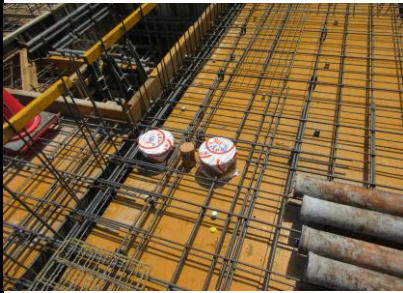


| | |
|---|-----------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 87 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | 床スラブ (S4) |
| 補強筋が計画通りに設置されていることを確認。 | |
|  | |

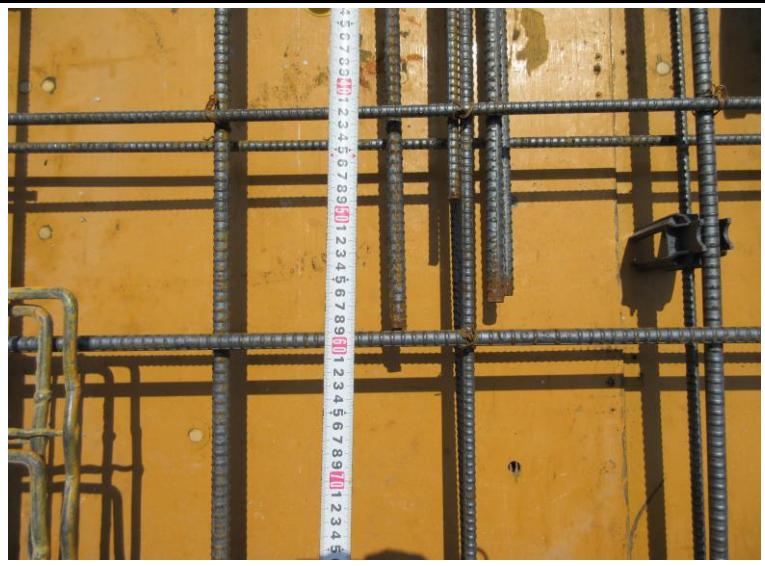


現況検査により認められる状況の記録

| | |
|--|----------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 88 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | キャンテイスラブ (CS1) |
| 計画通りの配筋組が行われていることを確認。上端筋 (主筋: 短辺方向) D10・D13@200mmチドリ | |

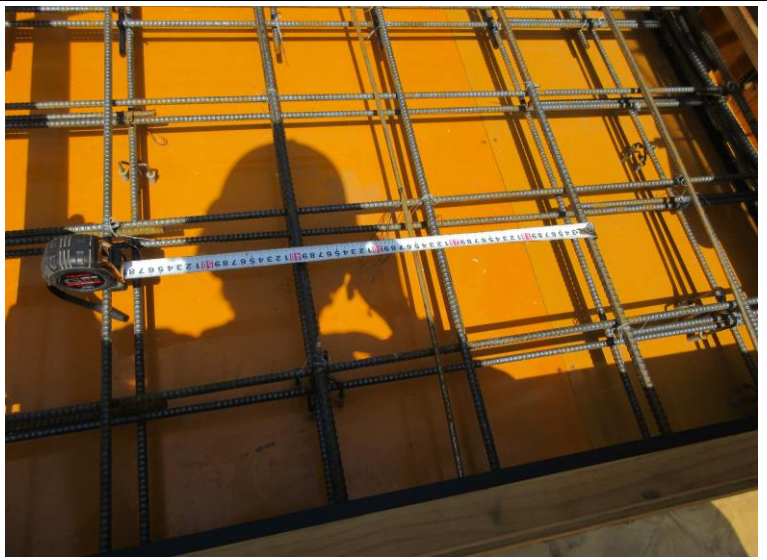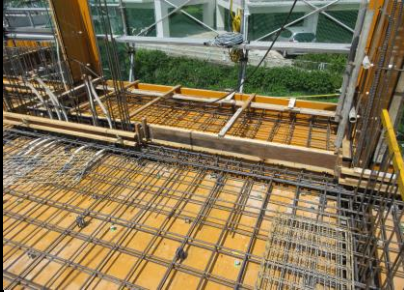

| | |
|-----------|----------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 89 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | キャンテイスラブ (CS1) |
| 同上。 | |

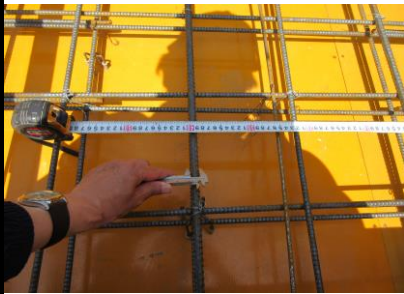

| | |
|--|----------------|
| 令和5年5月17日 | |
| NO | 90 |
| 場所 | AB棟 (A棟) |
| 部位 | キャンテイスラブ (CS1) |
| 計画通りの配筋組が行われていることを確認。上端筋 (配力筋: 長辺方向) D10@200mm | |

